

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

### PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### **PDTIC 2019**

Data: 27/05/2019

Versão 1.2



#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira

1° VICE-PRESIDENTE

Desembargador Wellington Emanuel Coimbra

de Moura

**CORREGEDOR-GERAL** 

Desembargador José Augusto Gomes Aniceto

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Maria Alice de Carvalho Panizzi

SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Aluízio Carlos Wanderley Grochocki

Daniel Targa Dias Anastacio Johnatan Daniel Fromholz Lima

Alessio Roman Junior

Pablo Tavares

2º VICE-PRESIDENTE

Desembargador José Laurindo de Souza

Netto

**CORREGEDOR** 

Desembargador Mario Helton Jorge

SUBSECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juliana Moreno Dias Paredes

DIRETOR DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Nelson Joaquim Santos** 

COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGESTIC)

Danilo Kovalechyn

Fábio de Araújo

Fábio Luís Bruch

Jean Paul Bonnevialle

Luiz Fernando Moletta Alves

Magno Mario Bayer Filho

Márcio Mortensen Wanderley

Maria Esther Aguirra de Moraes

**Nelson Joaquim Santos** 

**Pablo Tavares** 

Paulo Alfredo Ribas Toledo

Rafael Coninck Teigão

Rolf Mertens Junior

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2019. 52 p.: il.

1. Tecnologia da informação. 2. Gestão pública. 3. Administração Pública. 4. Gestão e Governança. 5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTO						
Descrição	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPR 2019					
Objetivo	Este plano é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as necessidades de tecnologia de informação e de comunicação do TJPR para o ano de 2019. Protocolo SEI 0082732-35.2018.8.16.6000					
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	Divisão	Assessoria Técnica			
Criado em	11/2018	Revisão	Anual			

VERSION	VERSIONAMENTOS						
Versão	Data	Autor	Descrição				
1.0	28/11/2018	Equipe Governança de TIC	Revisão do Documento com Diretoria e Gestores DTIC, contempla as necessidades do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019 vs.1.1.				
1.1	04/12/2018	Equipe Governança de TIC	Edição do documento conforme solicitações dos Gestores: - Revisão da tabela dos sistemas Administrativos;				
1.1.1	24/05/2019	Equipe Governança de TIC	Compatibilizar alterações com o Plano de Contratações STIC vs. 1.2, conforme segue: a) Alterações nas tabelas do capítulo 7; b) Alterações no capítulo 8; c) Alterações no capítulo 10;				
1.2	27/05/2019	Equipe Governança de TIC	Correções e aprovação pelo Comitê de Gestão de TIC. (Valor Global aprovado R\$ 97.134.646,79)				

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

### **SUMÁRIO**

1.	INTRODUÇÃO	7
	1.1. Objetivos	8
	1.2. Abrangência	8
	1.3. Período de Vigência	8
	1.4. Metodologia Aplicada	g
	1.5. Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC	9
2.	REFERENCIAL ESTRATÉGICO	13
	2.1. Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)	13
	2.2. Objetivos Estratégicos de TIC	14
	2.3. Documentos de Referência	15
3.	ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR	16
	3.1. Organograma Atual	16
	3.2. Organograma Proposto	17
	3.3. Quadro de Pessoal Atual	18
4.	RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR	19
	4.1. Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior	19
	4.2. Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior	24
5.	RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2018	25
6.	PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR	29
	6.1. Sistemas de Informação Judiciais do TJPR	29
	6.2. Sistemas de Informação Administrativos do TJPR	34
	6.3. Outras ferramentas de Software	35
7.	PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI	36
	7.1. Ações, Projetos e Aquisições para 2019 alinhados ao PETIC 2015-2020	37
8.	RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2019	48
	8.1. Itens Novos Inseridos nesta Revisão	48
	8.2. Itens Cancelados na Revisão	48
	8.3. Itens Alterados na Revisão	49
9.	PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	50
10.	PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2019	50
	10.1. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (revisão Nov./2018)	50
	10.2. Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça	52
	10.3. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto	52
11.	CONCLUSÃO	53



	-			 -
_	^			 
	Δ	_	Ε	 1 -
8.	~		_	 <b>~.</b> J

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020	
Tabela 2 - Documentos de Referência	
Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC	18
Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2018	23
Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2018	25
Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultados do TJPR	26
Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultados do TJPR por Tópico	27
Tabela 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultado do TJPR por Segmento	27
Tabela 9 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR	33
Tabela 10 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR	35
Tabela 11 - Outras ferramentas de Software	35
Tabela 12 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2019	47
Tabela 13 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa	50
FIGURAS	
Figura 1 - Alinhamento Institucional	
Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC	11
Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC (cont.)	12
Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)	13
Figura 5 - Organograma Atual do DTIC	16
Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC	17
Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior	24
Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Tribunais Estaduais	25
Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte	28
Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Por Tipo de Resposta	28
Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa	50
Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça	52

Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto .......52



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que visa atender às necessidades tecnológicas do TJPR para o período. Este plano possibilita orientar o uso correto das ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) com foco na gestão.

Nele são relacionadas todas as ações que a área de TIC terá que executar para o alcance das metas, organizadas no Portfólio de Ações e Projetos que é apresentado no Capítulo 7. A implementação do PDTIC, conjuntamente com os demais planos do departamento, materializa a estratégia de médio e longo prazos presentes no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPR, em ações e projetos, dando publicidade, agilizando o trâmite de informações, propiciando a padronização técnica dos serviços, processos e aplicações, além de trazer economicidade e racionalização na utilização de recursos de TIC.

Num contexto geral, o alinhamento entre os planos PDTIC e PETIC (departamental), PEI (institucional) e PE CNJ (nacional) pode ser ilustrado por meio da figura a seguir:




Figura 1 - Alinhamento Institucional

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enfatiza a necessidade da elaboração do PDTIC no âmbito do Poder Judiciário, conforme suas próprias resoluções nº 182/2013 e 211/2015.

A elaboração desse documento teve como premissa o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2015-2020) do TJPR e foi concretizado com o apoio da Presidência do Tribunal, da Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC), da Direção do DTIC, do Comitê Gestor de TIC, e demais

PDTIC 2019 7



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

colaboradores das unidades do DTIC.

Esta versão do PDTIC contempla as demandas, necessidades e sugestões da comunidade institucional do TJPR, bem como ações e projetos do próprio Departamento para a sua evolução. O desdobramento financeiro e respectivas licitações são mencionadas no artefato denominado de "Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação" (PCSTIC) para o exercício de 2019.

#### 1.1. Objetivos

O PDTIC tem como objetivos:

- a) Sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o exercício, contemplando as necessidades de TIC do TJPR e oportunidades de melhorias na área de TIC;
- b) Organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (Resolução TJPR Nº 138/2015, Resoluções do CNJ, Nº 182/2013 e Nº 211/2015);
- c) Servir de base para a elaboração da proposta orçamentária do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) para o ano fiscal subsequente;
- d) Servir de base para a elaboração do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC).

#### 1.2. Abrangência

Todos os procedimentos e ações apontados neste documento foram definidos considerando as necessidades levantadas e projetos de TI, ora em execução, junto às divisões e assessorias do departamento, para o período de um ano. As ações foram propostas nesta edição do PDTIC de modo a possibilitar significativa melhoria na nota CNJ-iGovTIC-JUD a ser alcançada ao final do novo período.

#### 1.3. Período de Vigência

A vigência do Plano é anual com possibilidade de revisões no período, conforme definido no item adiante "Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC", nas seguintes hipóteses:

- a) alteração do Plano de Contratações de Soluções de TIC;
- b) alteração no orçamento previamente designado para o DTIC, podendo necessitar ajustes nas ações do PDTIC;



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

- c) na ocorrência de supressão ou inclusão de novas demandas estratégicas;
- d) na necessidade de repriorização das ações;
- e) na ocorrência de ações extraordinárias que possam interferir no andamento das ações previamente aprovadas.

#### 1.4. Metodologia Aplicada

Para a elaboração do PDTIC, adotou-se o modelo de referência definido pela Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as devidas adaptações para as condições existentes no TJPR.

#### 1.5. Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC

No processo de elaboração e revisão do PDTIC, as seguintes etapas são executadas:

**Preparação e revisão**: preparação do novo processo com comunicação do início do processo, mobilização da equipe e releitura dos principais documentos;

Levantamento das necessidades: levantamento das demandas de TIC junto às unidades do TJPR, cúpula, divisões e assessorias do DTIC, aplicando reuniões investigativas ou questionamentos via e-mail;

**Consolidação das necessidades**: consolidação das necessidades e alinhamento às iniciativas propostas no PETIC considerando:

- a) as necessidades externas junto à Alta Administração e a outros departamentos;
- b) as necessidades internas do departamento identificadas junto às divisões e assessorias;
- c) as necessidades de infraestrutura para manutenção, sustentação, redimensionamento da capacidade e continuidade dos serviços de TIC.

**Identificação, classificação e priorização das ações**: identificação das ações, agrupamento em classes e priorização das ações objetivando o melhor conjunto delas para maximizar o atingimento dos objetivos estratégicos;

**Validação, priorização e aprovação**: a SGTIC prioriza e aprova as ações elencadas no PDTIC:

**Publicação** e comunicação: após aprovação superior, o documento é oficialmente publicado e uma apresentação do Plano é efetuada no DTIC.



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Uma revisão deste documento está programada anualmente, nos meses de maio e junho, de modo a acompanhar a dinâmica das ações do Poder Judiciário e o realinhamento estratégicos (quando necessário). Durante esta revisão é possível adicionar, excluir, modificar ações e projetos e alterar prioridades. Além desta, revisões extraordinárias podem ser convocadas pelo Diretor do DTIC ou pelo Comitê Gestor de TIC.

A qualidade destas revisões está diretamente relacionada ao acontecimento das revisões periódicas dos planejamentos estratégicos institucional (PEI) e departamental (PETIC), necessárias para o alinhamento contínuo.



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

De uma forma geral, o fluxo do processo de elaboração e revisão do PDTIC pode ser visualizado no diagrama seguinte:

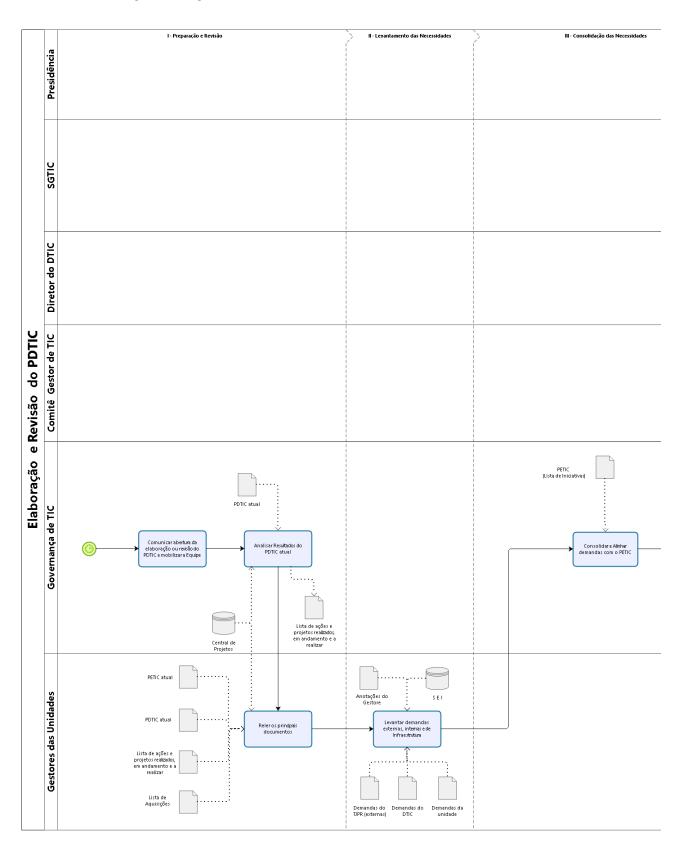


Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

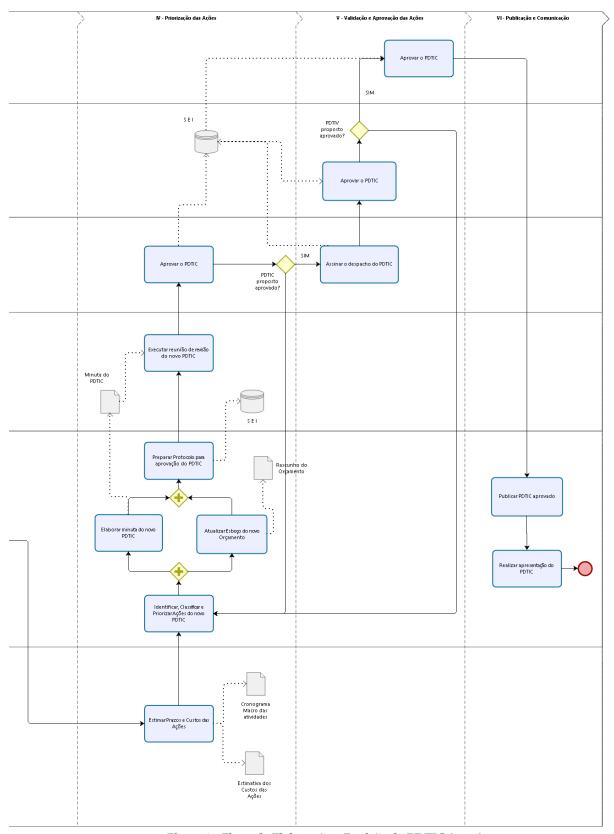


Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC (cont.)

# Estado do Parana

#### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

O processo de elaboração do PDTIC considerou o Mapa Estratégico de TIC do PETIC 2015-2020, além de alguns documentos e metodologias de referência nacional e internacional citados na tabela 2 adiante.

#### 2.1. Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)

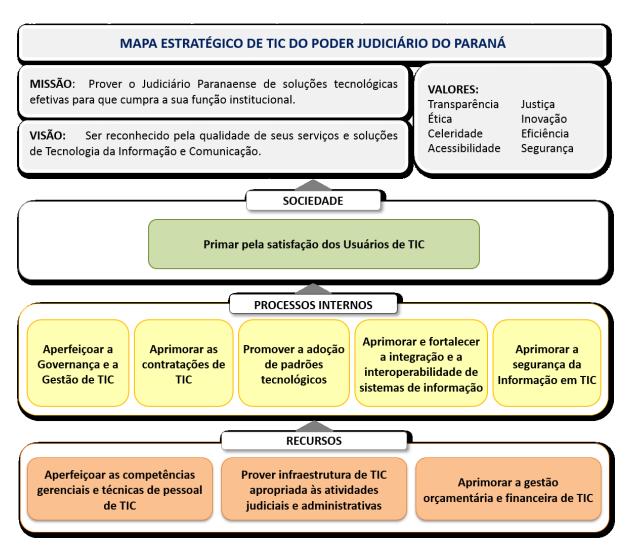


Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)

PDTIC 2019 13



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 2.2. Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva	OETIC	Descrição do Objetivo Estratégico
	01	Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
Recursos	02	Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
	03	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
	04	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
	05	Aprimorar as contratações de TIC
Processos Internos	06	Promover a adoção de padrões tecnológicos
	07	Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
	08	Aprimorar a segurança da informação de TIC
Sociedade	09	Primar pela satisfação dos Usuários de TIC

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020

#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 2.3. Documentos de Referência

As seguintes diretrizes, planos e guias de melhores práticas internacionais foram consideradas na elaboração deste plano:

Fonte	Descrição da referência	Publicação
	Macrodesafios do Poder Judiciário para o período 2015-2020, em especial o que trata da "Melhoria da infraestrutura e governança de TIC"	03/2015
	Diretrizes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), estabelecido na Resolução 211	15/12/2015
	Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação (GSI) no âmbito do Poder Judiciário	06/2012
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário Nacional 2016-2020, conforme estabelecido na Portaria 85	08/07/2016
CNJ	Diretrizes das Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, estabelecido pela Resolução 182	17/10/2013
	Diretrizes do Sistema Informatizado de Processo Judicial (PJe), estabelecido pelo Resolução 185	18/12/2013
	Diretrizes da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 192	08/05/2014
	Diretrizes da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecido na Resolução 194	26/05/2014
	Diretrizes do Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 198	01/07/2014
SISP	Guia de elaboração de PDTIC do Sistema de Administração de Recursos da Tecnologia da Informação, versão 1.0	11/10/2011
ISACA	Guia de melhores práticas de Governança de TIC, COBIT® 5.0	2012
AXELOS	Guia de Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL® v3 (2011)	2011
PMI	Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBok®, versão 5) sobre práticas na gestão de projetos	2013
	Plano Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2020)	09/2016
TJPR	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2015-2020) (SEI 0014991-46.2016.8.16.6000)	28/09/2016

Tabela 2 - Documentos de Referência



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

### 3. ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR

O DTIC está estruturado segundo o organograma abaixo desde 1º de agosto de 2010 (Decreto Judiciário nº 568, de 26 de julho de 2010).

Nos organogramas abaixo (atual e proposto), as quatro áreas agrupadas apenas ilustram a afinidade das unidades do departamento e todas estão subordinadas diretamente à Diretoria do DTIC.

#### 3.1. Organograma Atual

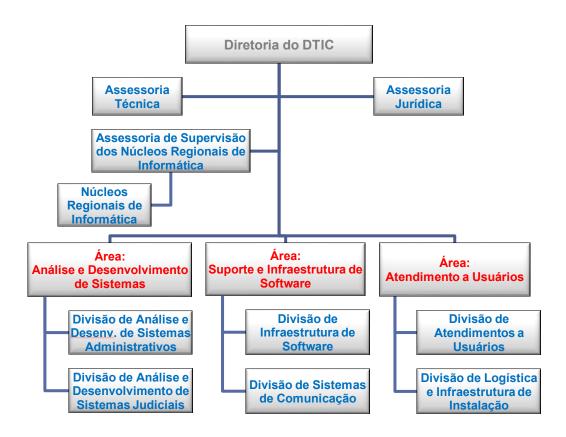


Figura 5 - Organograma Atual do DTIC

PDTIC 2019 16



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 3.2. Organograma Proposto

Em 29/01/2016, o departamento propôs uma reestruturação funcional (SEI Nº 0026661-47.2017.8.16.6000) para fazer frente a dinâmica das novas atribuições e para o cumprimento das resoluções emanadas pelo CNJ. Esta reestruturação foi estudada internamente no DTIC culminando na proposta de um novo organograma com algumas readequações.

O organograma proposto foi encaminhado à Alta Administração para análise e aprovação.

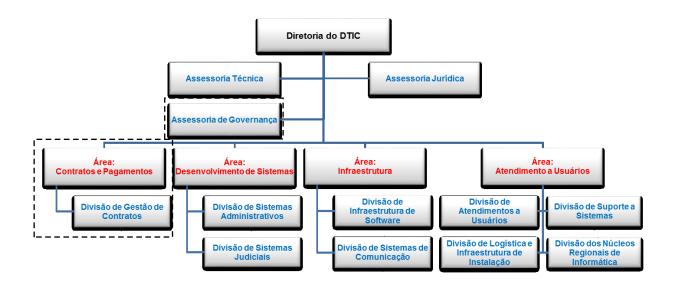


Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC

PDTIC 2019 17



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 3.3. Quadro de Pessoal Atual

Unidade	Cargo	Subtotal
DTIC-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Estagiário	1
	Oficial Judiciário	1
	Técnico em Computação	1
	Técnico Judiciário	1
AT-ASSESSORIA TÉCNICA	Analista de Sistemas	5
	Estagiário	1
	Técnico em Computação	1
	Técnico Judiciário	5
AJ-ASSESSORIA JURÍDICA	Assessor Jurídico	4
	Estagiário	1
DAU-DIVISÃO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS	Analista de Sistemas	1
	Estagiário	4
	Oficial Judiciário	4
	Técnico em Computação	35
	Técnico Judiciário	1
DSC-DIVISÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	Analista de Sistemas	5
	Oficial Judiciário	2
	Técnico em Computação	12
	Técnico Judiciário	1
DIS-DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE	Analista de Sistemas	18
	Técnico em Computação	5
	Técnico Judiciário	1
ASNRI-ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA	Estagiário	29
	Técnico em Computação	65
DADSA-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Analista de Sistemas	29
	Técnico em Computação	1
DADSJ-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JUDICIAIS	Analista de Sistemas	34
	Estagiário	1
DLII-DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO	Estagiário	1
	Técnico em Computação	9
	Técnico Judiciário	2

Total de colaboradores do Departamento = 281

Totais por Cargo:

Analista de Sistemas = 92 Assessor Jurídico = 4 Estagiário = 38 Oficial Judiciário = 7 Técnico em Computação = 129 Técnico Judiciário = 11

Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC

#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

#### 4. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

As Ações e Projetos do Portfólio 2018, apresentaram as seguintes atualizações (na atualização de nov/2018):

#### 4.1. Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
01.01	Elaborar e implantar o Plano de Anual de Capacitação	AT	Concluído	
01.02	Adquirir livros e periódicos	AT	Concluído	0028670-16.2016.8.16.6000
01.03	Capacitar técnicos e estagiários - transmissão de conhecimentos inerentes às atividades relacionadas a gerenciamento de estações de trabalho e dispositivos – vídeo aulas – 1ª fase	ASNRI	Concluído	
02.01	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software	AT	Em execução	
02.02	Revisar Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Hardware	DIS	Concluído	
02.03	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores)	ASNRI	Concluído	0114964-71.2016.8.16.6000
02.04	Aquisição de 800 Notebook - substituição dos atuais equipamentos de Magistrados de 1º Grau, Salas de Sessões da TRU e Ass. Correicional da CGJ	ASNRI	Concluído	0115357-93.2016.8.16.6000
02.05	Aquisição de 500 Scanners de médio porte.	ASNRI	Concluído	0009749-72.2017.8.16.6000
02.06	Servidores Corporativos destinados a infraestrutura de virtualização.	DIS	Concluído	0027613-26.2017.8.16.6000
02.07	Adquirir 2 novos Storages de 1 PB cada	DIS	Concluído	0067457-17.2016.8.16.6000
02.08	Adquirir 2 equipamentos de armazenamento de backup em disco desduplicado com 250TB cada (Upgrade DataDomain)	DIS	Concluído	0011369-56.2016.8.16.6000
02.09	Adquirir 4 Switches SAN, cada um com 96 portas	DIS	Concluído	0067350-70.2016.8.16.6000
02.10	Adquirir equipamentos de rede wireless	DSC	Concluído	0015656-62.2016.8.16.6000
02.11	Adquirir solução de videoconferência	DSC	Concluído	0012976-07.2016.8.16.6000
02.12	Implantar solução de videoconferência	DSC	Concluído	0012976-07.2016.8.16.6000
02.13	Implantar solução de balanceamento de carga	DSC	Concluído	0008365-11.2016.8.16.6000
02.14	Implantar acesso redundante à Internet	DSC	Concluído	
02.15	Implantar a gravação de ligações para a Ouvidoria Geral da Justiça	DSC	Concluído	
02.16	Aquisição de 100 microcomputador desktop padrão All in One	ASNRI	Concluído	0004682-63.2016.8.16.6000
02.17	Aquisição de 100 Scanners	ASNRI	Concluído	0004698-17.2016.8.16.6000
02.17	Implantar os 99 kits para salas de audiências	ASNRI	Concluído	0035456-13.2015.8.16.6000
02.17	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço Exchange através do Zabbix	DSC	Concluído	
02.17	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço de DNS através do Zabbix	DSC	Concluído	
02.18	Adquirir serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante	DSC	Concluído	0011962-17.2018.8.16.6000
02.18	Adquirir novas licenças para o software AlivePRO	DIS	Concluído	0055168-18.2017.8.16.6000
02.18	Adquirir renovação do suporte técnico, atualização de versão e atualização da tabela de preços de insumos do VOLARE (Engenharia)	AT	Cancelado	



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.18	Aquisição de 40 Switches 24p Gigabit PoE + 40 Switches 48p Gigabit PoE + 35 interfaces SPF 1000BaseSX	DSC	Concluído	0023390-98.2015.8.16.6000 0032194-84.2017.8.16.6000
02.18	Adquirir solução de gravação de audio, vídeo e sonorização das salas de sessão do TJPR, com sistema de votação integrado	DIS	Cancelado	0025002-03.2017.8.16.6000
02.18	Implementações e correções no sistema JudWIN (banco horas)	AT	Concluído	0037010-75.2018.8.16.6000
02.19	Upgrade Blade HP	DIS	Concluído	0045025-67.2017.8.16.6000
02.20	Contratação de Serviços telefônicos fixos comutados – STFC, para realização de chamadas com destino a telefones fixos e móveis	DSC	Concluído	0024936-23.2017.8.16.6000
02.21	Serviço para acesso à internet através de rede celular, com fornecimento, em regime de comodato, de 300 (trezentos) dispositivos USB	DSC	Cancelado	0047259-22.2017.8.16.6000
02.22	Adquirir Multifuncional laser/led monocromática e impressora color pequeno porte / Outsourcing	DLII	Concluído	0062771-79.2016.8.16.6000 0079511-78.2017.8.16.6000
02.23	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço Exchange através do Zabbix	DSC	Não Iniciado	
02.24	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço de DNS através do Zabbix	DSC	Não Iniciado	
02.25	Implementar procedimentos de monitoramento do Firewall no Zabbix	DSC	Concluído	
02.26	Implantar relatórios gerenciais de impressão - Coleta e armazenamento de logs de impressão (ELK)	ASNRI	Concluído	
02.27	Implantar relatórios de visibilidade de rede Netflow	DSC	Concluído	
02.29	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSA	Em execução	
02.30	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSJ	Em execução	
02.31	Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché conform detalhamento do projeto	DIS	Em execução	0101778-78.2016.8.16.6000
02.32	Adquirir solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	ASNRI	Em execução	0070522-49.2018.8.16.6000
02.33	Desenvolver, testar e implantar novas funcionalidades do PJe	DADSJ	Cancelado	
02.34	Atualizar 4 licenças do software Ábacus e renovação de assinatura de remessa de índices	AT	Concluído	0013265-03.2017.8.16.6000
02.35	Atualizar 6 licenças de software Liferay (Portal)	DIS	Concluído	0050303-49.2017.8.16.6000
02.36	Ferramenta de administração de banco de dados (ACQUA STUDIO)	DIS	Cancelado	0051885-84.2017.8.16.6000
02.37	Adquirir manutenção sistema JUDWIN	DADSJ	Cancelado	
02.38	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0	DIS	Adiado	
02.39	Atualizar o firewall (versão 7.1)	DSC	Concluído	
02.40	Migrar para Windows 10. Customizar distribuir	DSC	Não Iniciado	
02.41	Migrar para Windows 10 - Customizar, distribuir, migrar e gerenciar	ASNRI	Concluído	0005704.00.2046.0.45.5022
02.42	Adquirir licenças de software SONY Veges para a	AT	Em execução	0095704-08.2016.8.16.6000
02.43	Adquirir licenças do software SONY Vegas para a  ESEJE  Superto com discito a atualização do software	AT	Concluído	0042438-09.2016.8.16.6000
02.44	Suporte com direito a atualização do software  JIRA 500 licenças	DIS	Concluído	0031794-07.2016.8.16.6000
02.45	Adquirir software, treinamento e consultoria para BI (Business Intelligence)	DIS	Concluído	0053351-16.2017.8.16.6000



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.46	Adquirir servidores corporativos / banco de dados	DIS	Concluído	0039395-64.2016.8.16.6000
02.47	Atualizar o PostgreSQL para versão 9.5	DIS	Concluído	
02.48	Avaliar e adquirir novos servidores para os bancos do Projudi (em duplicidade com o item 02.46)	DIS	Concluído	0039395-64.2016.8.16.6000
02.49	Avaliar ferramentas de modelagem	DIS	Concluído	
02.50	Adquirir ferramenta de embaralhamento e subconjunto de bases de dados	DIS	Concluído	0030350-36.2016.8.16.6000
02.51	Elaborar e executar estratégia para substituição do Caché (contingência)	DIS	Concluído	
02.52	Elaborar e executar estratégia para continuidade do ambiente legado Sybase	DIS	Concluído	
02.53	Garantir atualizações, suporte e manutenção para o banco de dados Sybase (JudWin)	DIS	Concluído	0041832-44.2017.8.16.6000
02.54	Prospectar ferramenta que permita fazer busca no servidor de controle de versão	DIS	Cancelado	
02.55	Instalar ferramenta para facilitar análise do histórico de login de usuário no CAS	DIS	Concluído	
02.56	Avaliar novo serviço para controle de modificações (GIT)	DIS	Concluído	
02.57	Atualizar a solução do Lync Server 2013 para Skype For Business Ativar a nova solução de DNS	DSC	Em execução	
02.59	Promover o uso de Caixas Corporativas nas	DSC	Concluído	
02.60	unidades da Secretaria  Desenvolver / otimizar / melhorar performance	DADSJ	Em execução	
02.61	dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ  Desenvolver / otimizar / melhorar performance	DADSA	Em execução	
03.01	dos sistemas desenvolvidos pela DADSA Incentivar utilização do módulo de	AT	Concluído	
03.02	orçamentação do sistema Gladius  Promover melhorias no módulo de	AT	Concluído	
	Orçamentação do sistema Gladius			
03.03	Elaborar Plano de Contratação TIC 2019 Elaborar relatório de fechamento 2018 (ações	AT AT	Concluído Concluído	
03.05	executadas, orçamento planejado x executado)  Aprimorar o acompanhamento da execução do	AT	Concluído	
	Orçamento			0074500 74 0045 0 46 6000
04.01	Reestruturar o DTIC	Diretoria DTIC	Em Execução	0074569-71.2015.8.16.6000 (Depende de ato do Presidente do TJPR)
04.02	Elaborar e revisar o PDTIC 2017 e 2018	AT	Concluído	
04.03	Revisar o Plano de Contratações 2018	ΑT	Concluído Não Iniciado	
04.04	Revisar o PETIC 2015-2020 Elaborar o PDTIC 2018	AT AT	Concluído	
04.06	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC	DTIC	Em Execução	
04.07	Implantar a Equipe de Governança de TIC	AT	Em Execução	
04.08	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM	AT	Em Execução	
04.09	Acompanhar projetos no EPM	AT	Em Execução	
04.10	Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Concluído	
04.11	Publicar o Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Concluído	
04.12	Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.13	Melhorar a Gestão de Processos de TIC	AT	Em execução	
04.14	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
04.15	Mapear Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Concluído	
04.16	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software	DIS	Não Iniciado	
04.17	Revisar Processo de Orçamentação de TIC	AT	Não Iniciado	
04.18	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (hardware)	ASNRI	Não Iniciado	
04.18	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Não Iniciado	
04.18	Adquirir Ferramenta para Gestão de Processos de Negócio (BPM)	AT	Cancelado	
04.19	Implantar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	Concluído	
04.18	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.20	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore	DIS	Não Iniciado	
04.21	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças	AT	Não Iniciado	
04.22	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Em Execução	0061365-86.2017.8.16.6000
04.23	Mapear Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (hardware)	ASNRI	Concluído	
04.24	Mapear Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (software)	ASNRI	Concluído	
04.25	Implantar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC	AT	Em execução	
04.26	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC	AT	Em execução	
05.01	Revisar documentos D.O.D. recebidos	AT	Em execução	
05.02	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182)	AT	Em execução	
06.01	Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos	AT	Em execução	
06.02	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software	DADSJ	Não Iniciado	
06.03	Implantar Processo de Sustentação de Software	DADSA	Não Iniciado	
06.04	Avaliar/desenvolver ferramenta de geração de código	DIS	Cancelado	
06.05	Avaliar sistema de virtualização leve (Docker)	DIS	Concluído	
06.06	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)	DIS	Em execução	
06.07	Adquirir ferramentas para auxílio ao Desenvolvimento de Software (Intellij IDEA Ultimate)	DIS	Concluído	0041575-19.2017.8.16.6000
06.08	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADSJ e DADSA	Em execução	
06.18	Adquirir Solução e Consultoria para Implantação da Automação de Testes de software	AT	Cancelado	
06.18	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.	DADSJ e DADSA	Em execução	
06.18	Atender ao projeto CNJ "Cadastro Nacional de Adoção"	DADSJ	Em execução	
06.18	Atender ao projeto CNJ "Banco Nacional de Mandados de Prisão II"	DADSJ	Em execução	
06.18	Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do	DADSJ	Em execução	



#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
	Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenentes (InfoConv-WS).			
07.01	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI	DADSJ	Em execução	
08.01	Elaborar norma de segurança de Acesso a Internet	DSC	Concluído	0029904-96.2017.8.16.6000
08.02	Elaborar norma de segurança de utilização do Correio Eletrônico	DSC	Concluído	0029764-62.2017.8.16.6000
08.03	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	DSC	Em execução	0072390-96.2017.8.16.6000
08.04	Elaborar norma de segurança de Videoconferência	DSC	Não Iniciado	
08.05	Elaborar norma de segurança de Telefonia	DSC	Não Iniciado	
08.06	Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas	DSC	Não Iniciado	
08.07	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários	DSC	Não Iniciado	
08.08	Adquirir solução de Antispam para 18.000 caixas postais	DSC	Concluído	0026174-77.2017.8.16.6000
08.18	Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	DSC	Em Execução	0015482-82.2018.8.16.6000
08.09	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC	DSC	Não Iniciado	
08.10	Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving)	DIS	Adiado	Dependente do item 08.11
08.11	Adquirir contrato de manutenção da sala segura (Datacenter II)	DIS	Cancelado	0061632-31.2017.8.16.6000 transferido ao DEA
08.12	Implantar o controle de execução de arquivos e scripts em estações de trabalho (AppLocker)	ASNRI	Concluído	
09.01	Estudos para terceirização da Central de Atendimento	DAU	Cancelado	
09.02	Elaborar e executar pesquisas de avaliações nos atendimentos	DAU	Concluído	
09.03	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2018	DAU	Concluído	
09.04	Elaborar e disponibilizar a Base de Conhecimento de TIC	DAU	Concluído	
09.05	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	AT	Em execução	0002215-77.2017.8.16.6000

Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2018

Todos os projetos com situação "Não iniciado", "Em execução" ou "Adiado" serão novamente planejados em 2019.





#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 4.2. Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior

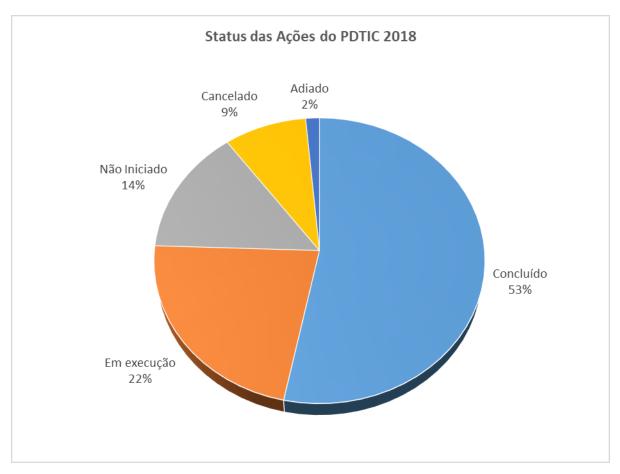


Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior

**PDTIC 2019** 24





### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 5. RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2018

A seguir é demonstrado o resultado do TJPR no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário previsto no art.32 da Resolução CNJ nº 211/2015 – ENTIC-JUD, que compreende o período de setembro de 2017 a setembro de 2018.

O resultado final deste questionário se traduz num índice e permite o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, chamado de Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - iGovTIC-JUD 2018.

Nível de Maturidade	Valor do iGovTIC-JUD
Ваіхо	0,00 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40
Satisfatório	0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70
Aprimorado	0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90
Excelência	0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00

Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2018

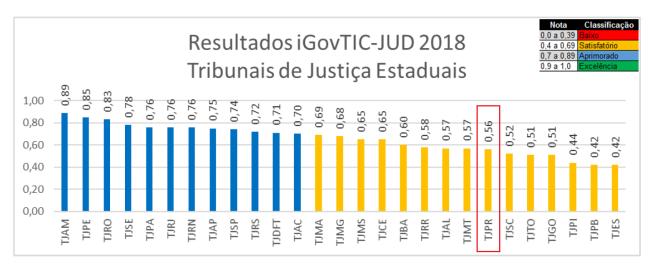


Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 - Tribunais Estaduais

PDTIC 2019 25



#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

#### Resultados no CNJ iGovTIC-JUD 2018

Nota do Órgão		Nível de Maturidade		
0,56		Satisfatório		
Dimensões Avaliadas	N	lota	Nível de Maturidade	
1. Das Políticas Planejamento	(	),72	Aprimorado	
Das Estruturas, Macroprocessos     Processos	e (	),44	Satisfatório	
Das Competências, Desenvolvimento e     Desempenho das Pessoas		),32	Baixo	
Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria     Controle de Gestão.		),23	Baixo	
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	(	),86	Aprimorado	
6. Dos Serviços de Infraestrutura		0,3	Baixo	
7. Detalhamento	(	),98	Excelência	
	Classifica	ıção 2018		
Segmento	Po	rte	Geral	
21° (de 27)	23° (d	3° (de 27) 75° (de 92)		
	Evolução i0	ovTIC-JUD		
2016	20	17	2018	
0,56	0,	58	0,56	

Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 - Resultados do TJPR

**PDTIC 2019** 26



#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

#### Resultados por Tópico

Tópico	Nota
1.1. Em relação à liderança	1
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos	0,88
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados	0,26
1.4. Em relação à transparência	0,74
2.1. Em relação à estrutura organizacional	0,84
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos:	1
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão	0,23
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação	0,03
2.5. Em relação aos processos de software	0,09
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento	0,55
3.2. Em relação ao desempenho	0,09
4.1. Em relação à gestão de riscos	0,05
4.2. Em relação ao monitoramento	0,22
4.3. Em relação à auditoria interna	0,5
5.1. Em relação aos sistemas de informação	0,61
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações	1
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico	0,96
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços	0,45
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura	0,16
7.1. Em relação à Força de Trabalho	0,98

Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 - Resultados do TJPR por Tópico

#### Resultado por Segmento

Segmento	Quantidade Órgãos	Média iGovTIC-JUD
Conselho	2	0,71
Superior	4	0,74
Eleitoral	27	0,64
Estadual	27	0,65
Federal	5	0,58
Militar	3	0,63
Trabalho	24	0,69

Tabela 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 - Resultado do TJPR por Segmento

**PDTIC 2019** 27



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### Classificação dos Órgãos de Grande Porte CNJ iGovTIC-JUD 2018




Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 - Classificação dos Órgãos de Grande Porte

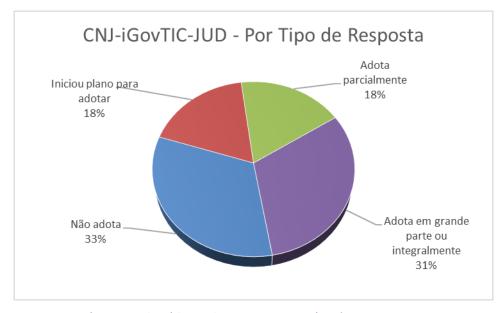


Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 - Por Tipo de Resposta

PDTIC 2019 28

### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 6. PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR

O portfólio de sistemas de informação do TJPR compreende todos os sistemas de informação judiciais (25) e administrativos (48), de desenvolvimento próprio ou de terceiros contratados ou cedidos por outros órgãos públicos mediante convênios.

Nas listas abaixo, os sistemas de informação e software de utilização geral considerados estratégicos (SEI Nº 0040087-63.2016.8.16.6000) estão marcados com um " (\*) " logo após o seu nome, indicando priorização quanto à disponibilidade e atendimento pelo DTIC.

#### 6.1. Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	PROJUDI (*)  Juizado Especial Cível  Juizado Especial Criminal  Turma Recursal  Infância e Juventude Cível  Adolescentes em Conflito c/ a Lei  Família  Juizado Especial da Fazenda Pública  Vara Cível  Vara da Fazenda Pública  Vara Criminal  Execução Penal e Medidas Alternativas  Plantão Judiciário  Competência Delegada  Auditoria Militar Cível  Corregedoria dos Presídios  Varas de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho  2º GRAU.  Plantão Judiciário  Mesa do Corregedor, 2º Vice-Presidência, CEVID, Magistrado, Chefe de Secretaria  Processo administrativo CGJ  Central de Precatórios  SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) - CNJ	Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos, implantado em todo o Estado do Paraná, abrangendo todas as competências judiciais em 1º grau, turma recursal e 2º Grau.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
2	SNU (*)	Geração de numeração única para processos judiciais, de acordo com CNJ.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

PDTIC 2019 29

SEI 0082732-35.2018.8.16.6000 / pg. 29



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
3	<ul> <li>Varas Criminais</li> <li>Distribuição Criminal</li> <li>Vara de Cartas Precatórias</li> <li>Vara de Auditoria Militar</li> <li>Varas do Tribunal do Juri</li> <li>Vara de Crimes contra o Menor</li> <li>Juizado Especial de Crimes contra a Mulher</li> <li>Varas de Trânsito</li> </ul>	Sistema de acompanhamento processual de processos físicos de varas criminais.	Não (somente página de consulta processua I)	PostgreSQL	Delphi	Consulta legado
4	CEPA - PENAS ALTERNATIVAS	Sistema de acompanhamento de penas alternativas – somente utilizado por Curitiba	Não	Mumps	Delphi/ Mumps	Consulta Legado
5	CEJA - COMISSÃO ESTADUAL DE ADOÇÃO	Controle de adoções internacionais	Não	Mumps	Delphi/ Mumps	Em uso
6	ORÁCULO - ANTECEDENTES CRIMINAIS (*)	Consulta de antecedentes criminais em bases de dados de sistemas (criminais)	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
7	<ul> <li>JUDWIN (*)</li> <li>Sistema Movimentação Processual</li> <li>Gabinete Desembargador</li> <li>Assessoria de Recursos</li> <li>Internet</li> </ul>	Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos em 2º Grau.  Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.	Não (somente página de consulta processua I)	Sybase	SQLServer	Em Uso (processo de desativaç ão pelo Projudi)
8	TURMAREC	Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos nas turmas recursais.  Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.	Não (somente página de consulta processua	Mumps	Delphi / Mumps	Em uso (somente consulta)
9	SIJEC – Juizados Especiais Criminais	Sistema de acompanhamento processual de juizados especiais criminais	Não (Somente página de consulta	PostgreSQL	Delphi	Consulta Legado



#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
			processua I)			
10	CALCULADORA DE PENA	Calculadora de penas – Execuções Penais	Sim	Não se aplica	Javascript	m uso
11	e-MANDADO (*)	Envio de mandados e alvarás eletrônicos para Delegacias de Polícia Civil.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
12	AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS	Autorização de viagens – Infância e Juventude	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
13	JURISPRUDÊNCIA	Gerenciamento da jurisprudência do TJPR (incluindo turma recursal).	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
14	Pad – Projudi Administrativo	Projudi Administrativo – Corregedoria e Presidência	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
15	DistProcessual	Sistema de gerenciamento para o cartório distribuidor, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização do referido cartório.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
16	Boletim Unificado	Centralizador de boletins mensais forenses (serventia e magistrado), em substituição ao boletim forense mantido pela Empresa Celepar e ao "Anexo C" solicitado pela CGJ.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
17	Cível Papel (*)	Sistema para controle de processos físicos de varas cíveis, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização de cartórios desta competência.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
18	Sessão Digital	Realização da sessão de julgamento em 2º grau utilizando documentos digitais, para	Sim	PostgreSQL	Java / WebIntegrat or	Em uso



#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
		processos físicos (dependência direta do sistema JUDWIN).				
19	CAJU - Cadastro de Auxiliares da Justiça	Sistema para cadastro e controle de auxiliares: peritos, síndicos/administradores judiciais, intérpretes, leiloeiros, jurados voluntários.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
20	Banco de Sentenças	Gerenciamento de sentenças em 1º grau.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
21	Gestão do Arquivo de Processos Judiciais - GAJUS	Sistema para gerenciar os processos físicos arquivados no Barracão de Pinhais.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
22	Consulta a Processos Físicos do 2º Grau – COP	Consulta a processos físicos do 2º grau, incluindo em segredo de justiça, a partir do Portal TJPR por advogados e servidores autorizados. Visa substituir a consulta atual do Portal TJPR.  Possui incorporado o pedido de sustentação oral.	Sim	Não se aplica	Java	Em uso
23	PJe 2º Grau (*)	Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos mantido pelo CNJ. Atenderá às ações em 2º grau, inicialmente às originárias.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
24	Processômetro – 1ª Vice- Presidência/Assessoria de Recursos	Aplicativo para apresentação de despachos elaborados e assinados junto à 1ª Vice-Presidência, para substituir o "Processômetro" vigente.	Não	Não se aplica	Java	Em uso
25	Calculadora Judicial	Cálculo de custas e multas.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

**PDTIC 2019** 32



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
26	Sistema de Expedição de	Aplicativo para expedição de	Sim	PostgreSQL	Java	
20	Certidões	certidões para fins eleitorais	JIII	FOSIGIESQL	Java	Em uso
27	SDP	Novo Sistema de gerenciamento para o cartório distribuidor- judicial e extrajudicial . Substituirá p DistProcessual.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

Tabela 9 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 6.2. Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

ID	Sistema/Projeto	Descrição	Internet	Banco de Dados	Linguagem	Status
1	Athos	Confecção de Documentos Eletrônicos	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
2	Centrocópia	* Controle de Fotocópias	Não	PostGreSQL	Delphi	Ativo
3	CEP	Web Services para consulta de CEPs	Não	PostGreSQL	Java	Ativo
4	Concursos	* Sistema de Controle de Concursos -	Não	PostGreSQL	Delphi	Ativo
		Corregedoria				
5	Controle de Faturas	Separador de Faturas Telefônicas	Não	Sem Banco	Java	Ativo
6	DOMUS	Gestão de Organograma e Órgãos	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
7	e-DJ	Diário da Justiça Eletrônico	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
8	FOL	** Folha de Pagamento - MUMPS	Não	Caché	MUMPS	Ativo
9	FOLHA	** Folha de Pagamento - Gráfico	Não	Sybase	Delphi	Ativo
10	Formulários	Construtor de formulários eletrônicos	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
11	Hércules	Gestão de Recursos Humanos	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
12	Hermes	Gestão Patrimonial, Contratos e Compras	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
13	Inscrição de Concursos	Inscrição em Concursos	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
14	Magistratura	* Sistema de Gestão de Dados Funcionais	Não	PostGreSQL	Delphi	Ativo
15	Malote Digital	Malote Digital - CNJ	Sim	Mysql	Java	Ativo
16	Mensageiro	Sistema para troca de mensagens	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
		institucionais				
17	Microfilmagem	Consulta a protocolos microfilmados	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
18	Plantão Judiciário	Cadastro e consulta de Plantões Judiciários	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
19	Ponto	Registro de Ponto	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
20	Portal Transparência	Consultas no Portal de Transparência do TJPR	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
21	PROT/TA	** Controle Protocolar - Extinto Tribunal de	Não	Caché	MUMPS	Ativo
		Alçada				
22	PROTCV	**Controle Protocolar - Fórum Cível	Não	Caché	MUMPS	Ativo
23	PROTWEB	Consulta a dados do Legado PROT	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
24	Publique-se	Publicação de Documentos Eletrônicos do	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
		Athos				
25	SADE	Sistema de Acompanhamento de Despesas (	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
		Contingenciamento Trabalhista)				
26	SCA	Controle de Acesso de Pessoas em unidades	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
27	SCM	Sistema do Centro Médico	Não	PostGreSQL	Delphi	Ativo
28	SEI	Sistema Eletrônico de Informações	Sim	Mysql	PHP	Ativo
29	SGDOC	* Base de Documentos para o SGMP	Não	PostGreSQL	Delphi	Ativo
30	SGMP	*Gerenciamento de Movimentação	Não	PostGreSQL	Delphi	Ativo
		Processual				
31	SGP	Gestão de Precatórios	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo



#### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

ID	Sistema/Projeto	Descrição	Internet	Banco de Dados	Linguagem	Status
32	SGRH	** Sistema de Gestão de Recursos Humanos	Não	Sybase	Delphi	Ativo
33	SisBibTJ	Controle Bibliotecário	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
34	SISCOM	** Controle de Comarcas	Não	Caché	MUMPS	Ativo
35	SISOUV	Sistema para Ouvidoria	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo
36	Unifomizado	Sistema Uniformizado de Recolhimento de Custas e Despesas Judiciais e Administrativas	Sim	PostGreSQL	Java	Ativo

Tabela 10 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

#### Legenda:

- \* Sistemas Legados.
- \*\* Sistemas legados e terceirizados que não possuem contrato vigente de manutenção.

#### 6.3. Outras ferramentas de Software

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	Assinador de documentos (*)	Assinador de documentos	Não	N/A	Java	Em uso
2	Portal TJPR					
3	EQP	Controle de Fitas de Backup				
4	ARES	Sistema de Controle de Suporte				
5	SGU	Sistema de Controle de Usuários				
6	SEGURANÇA	Sistema de Autorização de Sistemas Próprios TJPR				
7	GESTÃO DE DIÁRIAS	Departamento Econômico e Financeiro				
8	Gladius	Sistema de Gestão Departamental				
9	SAU	Sistema de Atendimento a Usuários de Informática				

Tabela 11 - Outras ferramentas de Software



### DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 7. PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI

Os itens do Portfólio de Ações, Projetos e Aquisições em TI estão agrupados conforme o seu impacto primário nos objetivos estratégicos de TIC e nas respectivas iniciativas estratégicas preconizadas no PETIC 2015-2020.

Nas tabelas compreendidas no item 7.1 abaixo, a segunda coluna ("PCSTIC 2019") abriga o respectivo item do PCSTIC 2019, quando aplicável; a codificação constante na terceira coluna ("Ação") das tabelas é composta por três dezenas que identificam:

- a) número do objetivo estratégico do PETIC em vigência;
- b) dezena do ano em que a ação entrou no portfólio;
- c) número sequencial da ação dentro da iniciativa estratégica e do respectivo ano.

Ações canceladas não foram excluídas do Portfólio mas marcadas com hachuras para indicar a sua exclusão lógica.

O portfólio também foi aperfeiçoado para incluir em coluna separada ("SEI") o número do processo SEI! de forma que o gestor possa rapidamente identificar o processo da respectiva ação do portfólio.

PDTIC 2019 36



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

### 7.1. Ações, Projetos e Aquisições para 2019 alinhados ao PETIC 2015-2020

#### 7.1.1. Associadas ao OETIC.01 (Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aperfeiçoar o Plano Anual de Capacitação	3.2.1	01.19.01	Em Execução	Adquirir treinamentos e executar o Plano de Capacitação de TIC 2019		AT	DTIC	x	X	X	x	X	x	X	X	х	х	х	x
	N/A	01.19.02	Concluído	Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2019		AT	DTIC	X	X	X									

#### 7.1.2. Associadas ao OETIC.02 (Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaborar e executar o Plano de Atualização Tecnológica	N/A	02.17.01	Não Iniciado	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software		АТ	DTIC	x	x	х	x	X	x	x	х	х	x	х	x
	1.1.9	02.18.23	Em Execução	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 715 computadores). Contrato 301/2018	0083353- 32.2018	ASNRI	DTIC	x	x	х	x	x	x						
Assegurar a infraestrutura física de TIC nas unidades judiciárias do PJPR	1.2.1	02.19.01	Em Execução	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores).	0011365- 14.2019	ASNRI	DTIC	x	x	х	x	x	x	x	х	x	x	х	x
	1.2.7	02.19.07	Em Execução	Adquirir servidores corporativos (blade) destinados a infraestrutura de virtualização	0062631- 24.2018	DIS	DIS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х	
	1.1.1	02.18.02	Em Execução	Adquirir projetores multimídia (datashows), telas de projeção e webcams	0051047- 44.2017	ASNRI	ASNRI	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	х	x



Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	1.2.8	02.19.08	Em Execução	Adquirir webcam para magistrados, 911 unidades (ARP)	0073668- 98.2018	ASNRI	ASNRI	X	X	X	X	X							
	1.2.2	02.19.02	Cancelado	Adquirir solução de rede wireless (access point).  Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2		DSC	DSC	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х					
	1.1.6	02.18.03	Em Execução	Adquirir equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas)	0024240- 50.2018	DSC	DSC	x	x	X	x	X	x						
	1.2.3	02.19.03	Cancelado	Adquirir equipamentos de Telefonia.  Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2		DSC	DSC	х	х	Х	х	х	х	х	х	х			
	3.2.10	02.19.16	Em Execução	Adquirir Solução de Telefonia MX-one 60meses.	0034149- 82.2019	DSC	DSC	х	х	х	х	х	х						
	3.2.11	02.19.17	Em Execução	Adquirir 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de Conexões.	0026644- 40.2019	DSC	DSC	x	x	х	x	x	x	х	х	х	x	x	х
	3.2.14	02.19.19	Não Iniciado	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).		DSC	DSC	x	x	х	x	x	х	x	х	x			
	<del>3.2.5</del>	02.19.11	Cancelado	Contratar Solução de Serviços de Impressão (compra ou outsourcing ) (1600 unidades).  Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	<del>0011007</del> <del>49.2019</del>	DLII	AT	х	x	х	х	х	х	х					
	2.1.2	02.19.09	Em Execução	Adquirir cabos, canaletas, tomadas, etc.	0023257- 17.2019	DLII	DLII	x	X	х	X	X	x	x	X	X	X	X	x
	2.1.1	02.16.01	Em Execução	Adquirir peças para impressoras e microcomputadores	0078201- 71.2016	DLII	DLII	х	x	X	X	X	x	x	X	x	X	X	x
	1.1.4	02.18.22	Em Execução	Adquirir 2 impressoras de mesa para cartões de identificação. Garantia 3 anos e suprimentos.	0037904- 51.2018	DLII	DLII	x	x	X	X	X	x	x	x				
	3.2.13	02.19.18	Cancelado	Contratação de Solução para microfilmagem de Acervo Documental Administrativo do TJPR.  Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	0078705 09.2018	<del>AT</del>	AT	х	х	х	х	Х	х						
	1.1.2	02.18.16	Em Execução	Adquirir leitoras de códigos de barras	0020185- 56.2018	ASNRI	ASNRI	х	х	х	х								
Converter os Sistemas de Informação terceirizados por soluções próprias ou de	N/A	02.17.29	Em Execução	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)		DADSA	DIS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
outros órgãos públicos																			
	N/A	02.17.30	Em Execução	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)		DADSJ	DIS	x	x	x	x	x	x	x	x	х	x	x	x
	N/A	02.17.31	Em Execução	Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché conforme detalhamento do projeto	0101778- 78.2016	DIS	DADSA, DADSJ, G2V e GCJ	X	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x
	1.1.3	02.18.21	Em Execução	Adquirir solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	0070522- 49.2018	ASNRI	AT, DIS, DSC, DADSJ e DAU	x	x	х	x	х	х						
	3.2.6	02.19.12	Em Execução	Renovar 2 Licenças de software RED HAT, para suportar a atualização do SYBASE em ambiente Linux (suporte ao sistema JUDWIN)	0058652- 07.2018	DIS	DIS	x	х	х	х	х	x	х	x				
	N/A	02.17.38	Em Execução	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0		DIS	DIS	X	x	x	x	x	x	x	x	X			
	N/A	02.17.40	Em Execução	Migrar o Exchange para a versão 2016		DSC	DSC	x	x										
	3.1.7	02.17.42	Em Execução	Adquirir licenças de software para projetos de Engenharia (AutoCAD)	0017558- 79.2018	ASNRI	АТ	x	x	x									
	3.2.4	02.19.10	Não Iniciado	Adquirir 4 licenças do software Ábacus e índices de preços e econômicos. (prazo 24 meses).	0013265- 03.2017	AT	АТ	x	x	x									
	1.2.6	02.19.06	Em Execução	Adquirir Equipamentos de armazenamento de Backup em disco e Library.	0062631- 74.2018	DIS	DIS	x	х	х	х	х	x	х	х	x	x	х	х
	3.2.8	02.19.14	Em Execução	Renovar 94 Licenças DYNATRACE (software de gerenciamento de desempenho de aplicativos)	0061230- 40.2018	DIS	DIS	x	x	x	x	x	x	x					
	3.2.9	02.19.15	Em Execução	Renovar Licenças de Software (196 VMWare e 3 Vcenter)	0066416- 44.2018	DIS	DIS	x	x	X	x								
	3.2.3	02.18.12	Em Execução	Adquirir software para gestão de contratos de obras públicas para o Departamento de Engenharia do TJPR	0056100- 69.2018	АТ	DEA	x	x	х	x	х	x						
	3.1.3	02.18.15	Em Execução	Adquirir software "Creative Cloud para Equipes" (Adobe Photoshop) para a ESEJE e Assessoria de Imprensa	0013398- 11.2018	АТ	ASNRI	X	x	х	x	х	X	х	x	X	x	х	x



Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	3.2.15	02.19.20	Em Execução	Aquisição de Solução de Inteligência Artificial nos Processos judiciais.		DIS	DIS	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	N/A	02.17.58	Em Execução	Ativar a nova solução de DNS		DSC	DSC			X	X	X	X	X	X	X			
	1.2.4	02.19.04	Cancelado	Adquirir Ativos de Rede (Switches e acessórios).  Obs.: Cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2		<del>DSC</del>	DSC	x	х	Х	х	х	х	х	х	х			
	3.1.6	02.18.18	Em Execução	Aquisição de serviço de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção para substituição de contrato a vencer em 05/2019	0037348- 49.2018	DSC	DSC	x	х	х	х	X	х	x	x	х	x		x
	1.2.5	02.19.05	Não Iniciado	Solução de Videoconferência com garantia 60 meses	0034149- 82.2019	DSC	DSC	x	x	х	x	X	x						
Novas funcionalidades e melhorias nos Sistemas de Informação (+)	N/A	02.17.60	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ		DADSJ	DIS	x	x	x	x	X	х	x	x	x	x	X	x
	N/A	02.17.61	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA		DADSA	DIS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x
	3.2.16	02.19.21	Em Execução	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS.  Obs. novo item no PCSTIC 2019 vs. 1.2		АТ	АТ				x	x	х	x	х	х	x	х	x
	3.2.17	02.19.22	Em Execução	Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP.  Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2	0014104- 57.2019	DSC	DSC				x	x	x	x	x	x	x	x	x



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 7.1.3. Associadas ao OETIC.03 (Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aperfeiçoar o acompanhamento da execução do orçamento de TIC	N/A	03.19.01	Não Iniciado	Elaborar Plano de Contratação 2020		АТ	DTIC								X	X	X	x	
	N/A	03.19.02	Não Iniciado	Elaborar relatório de fechamento 2019 (ações executadas, orçamento planejado x executado)		AT	DTIC											x	x
	N/A	03.17.05	Não Iniciado	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento		AT	DTIC				X	X	X	x	X	x	X	х	x



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 7.1.4. Associadas ao OETIC.04 (Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a adequação organizacional do DTIC para atendimento às diretrizes estratégicas	N/A	04.17.01	Em Execução	Reestruturar o DTIC		Dir. DTIC	SGTIC e DPLAN		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	N/A	04.19.01	Em Execução	Revisar o PDTIC 2019		AT	DTIC		x	X	x	X	x						
	N/A	04.19.02	Em Execução	Revisar o Plano de Contratações STIC 2019		AT	DTIC				X	X	x	x					
	N/A	04.17.04	Não Iniciado	Revisar o PETIC 2015-2020		AT	DTIC						х	x	X	x			
	N/A	04.19.03	Não Iniciado	Elaborar o PDTIC 2020		AT	DTIC								X	X	Х		
	N/A	04.19.04	Não Iniciado	Elaborar o Plano de Contratações STIC 2020		AT	DTIC								X	x	х		
	N/A	04.19.05	Em Execução	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC		Dir. DTIC	SGTIC			x		x		x		x		x	
Promover a implantação da equipe de governança de TIC e rotinas de acompanhamento de projetos no DTIC	N/A	04.17.07	Em Execução	Implantar a Equipe de Governança de TIC		АТ	DTIC		x	x	x	x	X	x	X	x	x	x	x
Acompanhar e publicar periodicamente o desempenho dos projetos de TIC	N/A	04.17.08	Em Execução	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM		АТ	DTIC	x	x	x	x								
	N/A	04.17.09	Em Execução	Acompanhar projetos no EPM		AT	DTIC							x	X	x	X	X	X
	3.1.1	04.19.01	Cancelado	Contratar Consultoria e Suporte para Microsoft EPM e Microsoft Sharepoint. Obs. Cancelado no PCSTIC 2019 vs. 1.2		AT	DTIC	х	х	х	x	х	х						
	N/A	04.17.12	Não Iniciado	Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC						х	х	х	x	х	х	



Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Buscar o atendimento ao Perfil de Governança do iGovTIC	N/A	04.17.13	Não Iniciado	Melhorar a Gestão de Processos de TIC		АТ	DTIC	x	x	X	x	X	x	x	X	x	x	X	x
	3.1.2	04.18.08	Em Execução	Adquirir solução para gestão de serviços de TI (ITSM)	0032717- 62.2018	AT	DTIC	х	х	х	х	x	х	x	х	х	х	х	х
Implantar a Gestão por Processos em TIC (cf. Resolução CNJ 211/2015)	N/A	04.17.14	Não Iniciado	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC			X	X	x	x	x	x	x	x	x	
. ,	N/A	04.18.08	Não Iniciado	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC		DIS	DTIC						х	x	х	х	х	х	
	N/A	04.17.16	Não Iniciado	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software		DIS	DADSA, DADSJ				x	X	x	x	х	х	x	х	x
	N/A	04.17.17	Não Iniciado	Revisar Processo de Orçamentação de TIC		AT	DTIC						x	x					
	N/A	04.17.18	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC		ASNRI	DTIC				x	x	x	x	x				
	N/A	04.18.09	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC		DAU	AT					X	х	x	X				
	N/A	04.17.20	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore		DIS	DSC						x	x	x	x	x	х	x
	N/A	04.17.21	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças		AT	AT	x	x	X	X	X	x	x	x	x	x	х	x
Manter Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	N/A	04.18.10	Não Iniciado	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	0061365- 86.2017	DIS	АТ		х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х
Implantar a Gestão de Demandas de TIC	N/A	04.17.25	Em Execução	Implantar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC		АТ	DTIC				x	x	х	x	x	x	х	х	х
Aprimorar o processo de Gestão de Contratos em TIC	N/A	04.17.26	Em Execução	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC		АТ	АТ	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 7.1.5. Associadas ao OETIC.05 (Aprimorar as contratações de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aprimorar o processo de Contratação de TIC entre as unidades do DTIC	N/A	05.18.01	Em Execução	Revisar documentos D.O.D. recebidos		АТ	DTIC			X	x	x	x	X	x	x	X	x	X
	N/A	05.17.02	Suspenso	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182/2013)		AT	DTIC		x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x

## Estado do Parana PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

### 7.1.6. Associadas ao OETIC.06 (Promover a adoção de padrões tecnológicos)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a padronização de Processos no DTIC	N/A	06.17.01	Não Iniciado	Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos	АТ	DTIC		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Promover a padronização no desenvolvimento e manutenção de sistemas	N/A	06.17.02	Não Iniciado	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software	DADSJ	DADSA, DADSJ, DAU	X	X	x	X	x	x						
	N/A	06.17.03	Não Iniciado	Implantar Processo de Sustentação de Software	DADSA	DADSA, DADSJ, DAU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	N/A	06.17.06	Em Execução	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)	DIS	DADSJ, DADSA										x	х	X
Promover a aderência dos novos sistemas de informação judiciais e adm às recomendações do Art 20 da Res.	N/A	06.17.08	Em Execução	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADSJ e DADSA	DADSJ, DADSA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	N/A	06.18.02	Em Execução	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.	DADSJ, DADSA	DADSJ, DADSA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	N/A	06.18.03	Em Execução	Atender ao projeto CNJ "Cadastro Nacional de Adoção"	DADSJ	DTIC	X	X	X	x	X	x	x	X	x	X		
	N/A	06.18.04	Em Execução	Atender ao projeto CNJ "Banco Nacional de Mandados de Prisão II"	DADSJ	DTIC	x	x	x									
	3.1.11	06.18.06	Em Execução		59416- DADSJ 2018	DADSA	х	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 7.1.7. Associadas ao OETIC.07 (Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a aderência dos sistemas judiciais ao MNI	N/A	07.17.01	Em Execução	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI		DADSJ	DADSJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### 7.1.8. Associadas ao OETIC.08 (Aprimorar a segurança da informação de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a aprovação da Política de segurança da Informação	N/A	08.17.03	Em Execução	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	0072390- 96.2017	DSC	AT		x	х	х	х	x	x	x	x	x	X	
	N/A	08.17.04	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Videoconferência		DSC	AT		X	X	X	x	X	X	X	x	X	X	
	N/A	08.17.05	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Telefonia		DSC	AT		X	Х	X	х	X	X	X	х	X	X	
	N/A	08.17.06	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas		DSC	AT		X	x	X	X	X	X	X	х	X	X	
	N/A	08.17.07	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários		DSC	AT		X	X	x	x	x	X	X	х	X	х	
Incentivar a aquisição de softwares e hardware para as áreas de segurança de TIC	3.1.9	08.18.01	Em Execução	Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	0015482- 82.2018	DSC	DSC				x	x	x	x	x	x	x	x	
	3.2.2	08.18.02	Em Execução	Adquirir certificados digitais A3 (1000 unid.)	0067465- 23.2018	AT	AT	X	x	х	х	х	х						
	3.2.1	08.19.01	Em Execução	Adquirir certificados digitais A3 (5000 unid.)		AT	AT	X	X	X	X	X	X						



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	3.2.7	02.19.13	Em Execução	Adquirir Certificado Assinador de Codigo	0058582- 87.2018	DIS	DIS	х	Х	x	X	X	X						
Promover a execução da Gestão de Riscos para Segurança da Informação	N/A	08.17.09	Em Execução	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC		DSC	DTIC			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	N/A	08.17.10	Em Execução	Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving) (Eem aguardo da contratação da manutenção da sala segura pelo DEA)		DIS	DLII										X	x	x
	3.2.18	08.19.14	Não Iniciado	Solução de Segurança de Rede.  Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2		DSC	DSC				x	x	х	x	x	x	x	x	x

### 7.1.9. Associadas ao OETIC.09 (Primar pela satisfação dos Usuários de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.2	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Realizar pesquisa de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços de TIC	N/A	09.18.02	Não Iniciado	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2019		DAU	DTIC							x	x				
·	3.2.12	09.19.01	Em Execução	Contratação de Serviços da CELEPAR: 2,42 milheiros/mês de envelopamento de contracheques; 100h de Consultoria; Emissão de 2000 certificados digitais A3.	0085104- 54.2018	АТ	АТ	X	x	x	x	x	x						
Promover a institucionalização do Plantão de TIC	N/A	09.17.05	Suspenso	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	0002215- 77.2017	АТ	DTIC	x	x	х	х	x	x	x					

Tabela 12 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2019



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

## 8. RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2019

A atualização do Portfólio de Ações, Projetos e Aquisições impactou diretamente no Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019, o qual também foi revisado e os novos valores estão destacados no capítulo 10 deste documento.

#### 8.1. Itens Novos Inseridos nesta Revisão

São considerados itens novos aqueles que não constavam na versão anterior do plano e que necessitaram ser incluídos decorrentes de novas demandas, lapso de esquecimento de inclusão na versão anterior, modificação em razoável extensão de itens existentes (os quais foram refeitos), reagrupamento de itens, mudança de rumo, repriorização, entre outras razões.

Seq.	Ação	Título do Item Alterado	Número SEI	Item do PCSTIC 2019 vs.1.2
1.	02.19.21	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS.	Sem número	3.2.16
2.	02.19.22	Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP	0014104-57.2019	3.2.17
3.	08.19.14	Solução de Segurança de Rede	Sem número	3.2.18

#### 8.2. Itens Cancelados na Revisão

São considerados itens cancelados aqueles que não mais serão adquiridos no período atual ou que foram modificados em razoável extensão e incluídos em novos expedientes SEI! gerando-se novos itens incluídos; ou por não terem mais possibilidade de aquisição, em função da força de trabalho do DTIC já comprometida nos projetos de 2019, alguns decorrentes de novas demandas emergenciais não planejadas; ou suspensos no aguardo do prosseguimento de outros itens.

Seq.	Ação	Título do Item Cancelado	Número SEI	Item do PCSTIC 2019 vs.1.2
1.	02.19.02	Solução de Rede Wireless (access points)	Sem número	1.2.2
2.	02.19.03	Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP	0014104-57.2019	1.2.3
3.	02.19.04	Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios.	Sem número	1.2.4
4.	04.19.01	Contratar Consultoria e Suporte para Microsoft EPM e Microsoft Sharepoint.	Sem número	3.1.1
5.	02.19.18	Contratação de Solução para microfilmagem de Acervo Documental Administrativo do TJPR. Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	0078705-09.2018	3.2.13



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 8.3. Itens Alterados na Revisão

São considerados itens alterados aqueles que sofreram, ou uma alteração no escopo da aquisição; ou no valor previsto decorrentes de atualização de preços; ou com necessidade de adaptações devido às mudanças de mercado e/ou tecnológicas.

Seq.	Ação	Título do Item Alterado	Número SEI	Item do PCSTIC 2019 vs.1.2
1.	02.19.01	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores). Obs.: Solicitado valor maior no PCSTIC vs.1.2	0011365-14.2019	1.2.1
2.	02.19.07	Equipamento de armazenamento de Backup em disco e Library. Obs.: Solicitado valor maior no PCSTIC vs.1.2	0062631-74.2018	1.2.6
3.	04.18.08	Adquirir solução para gestão de serviços de TI (ITSM). Obs.: Solicitado valor maior no PCSTIC vs.1.2	0032717-62.2018	3.1.2
4.	02.18.15	Adquirir software "Creative Cloud para Equipes" (Adobe Photoshop) para a ESEJE e Assessoria de Imprensa. Obs.: Solicitado valor maior no PCSTIC vs.1.2	0013398-11.2018	3.1.3
5.	06.18.06	Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenentes (InfoConv-WS). Obs.: Solicitado valor maior no PCSTIC vs.1.2.	0059416-90.2018	3.1.11
6.	02.19.17	Adquirir 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de Conexões. Obs.: Solicitado valor maior no PCSTIC vs.1.2.	0026644-40.2019	3.2.11
7.	02.19.20	Aquisição de Solução de Inteligência Artificial nos Processos judiciais. Obs.: Reajustado valor menor no PCSTIC vs.1.2	Sem número	3.2.15



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

## 9. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

O Plano Anual de Capacitação de TIC será registrado no SEI 0087859-51.2018.8.16.6000 e que contempla as ações relacionadas aos treinamentos necessários para os colaboradores do DTIC em 2019.

#### 10.PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2019

O Plano de Contratação de Solução de TIC foi aprovado em conformidade com a resolução CNJ Nº 182/2013 SEI 0082732-35.2018.8.16.6000 e corresponde às contratações de materiais permanentes e serviços, com recursos do TJPR. Resumidamente podem ser classificadas segundo os tipos de despesas seguintes:

#### 10.1. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (revisão Maio/2019)

	2019	
TIPO DE DESPESA	Valor Previsto (R\$)	% do total
1. Despesas de Capital	R\$ 43.335.447,50	44,61%
2. Despesas Correntes	R\$ 390.709,24	0,40%
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	R\$ 41.480.281,84	42,70%
4. Contratos Vigentes	R\$ 11.928.208,21	12,28%
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS	R\$ 97.134.646,79	

Tabela 13 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa

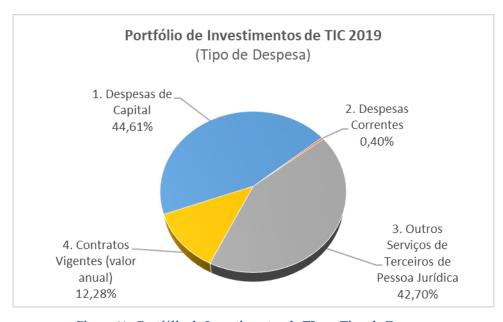


Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Os quatro tipos de despesas são descritos como:

<u>Despesas de Capital</u>: despesas que contribuem diretamente para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros;

<u>Despesas Correntes</u>: despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital;

Outros Serviços de Terceiros PJ: despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa;

<u>Contratos Vigentes</u>: previsão de contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.



## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

#### 10.2. Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça

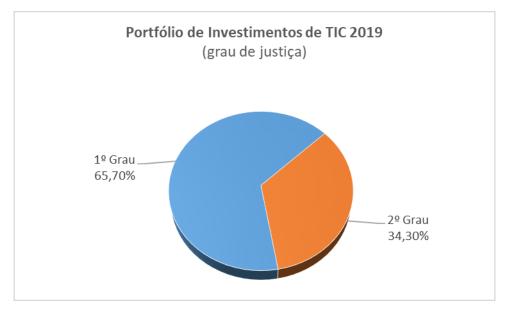


Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça

#### 10.3. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto



Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto



# DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

### 11.CONCLUSÃO

O PDTIC 2019 constitui-se num importante instrumento de gestão, orientando e harmonizando as decisões dos gestores de TI, de forma a traduzir os objetivos e iniciativas estratégicas de longo prazo em ações operacionais específicas e detalhadas para o ano seguinte a sua elaboração e aprovação. Para isto, utiliza-se o referencial estratégico documentado no Capítulo 2, que inclui o Plano Estratégico de TIC 2015-2020, entre outros artefatos de igual importância.

No entanto, ao longo do período de execução deste plano, ações planejadas necessitam de revisão em função de diversos fatores. Possivelmente, revisões futuras poderão impactar no Plano de Contratações de STIC, necessitando-se que este também seja revisto (Resolução CNJ 182/2013, Art. 7º, § 2º).

Participaram da elaboração e revisão do PDTIC, o Supervisor Geral de TIC, o Comitê Gestor de TIC, a equipe de governança de TIC e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Tão importante quanto a concepção e revisão do presente Plano, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase de execução, para que seja possível visualizar, de forma atualizada e precisa, a evolução do cumprimento da missão institucional deste departamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ R Alvaro Ramos, 157 CASA - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

#### INFORMAÇÃO Nº 4086326 - DTIC-AT

SEI!TJPR Nº 0082732-35.2018.8.16.6000 SEI!DOC Nº 4086326

#### Senhor Diretor:

Baseado no Art. 7º § 2º da resolução 182/2013 do Conselho Nacional da Justiça, que prevê a revisão periódica do Plano de Contrações de Soluções de TIC (PCSTIC) e considerando o Plano de Contratações de STIC 2019 versão 1.1 (doc. 3471521) vigente e publicado em Novembro de 2018 (doc. 3538850), tomamos a liberdade de anexar uma proposta de **Revisão do PCSTIC 2019 versão 1.2** (doc. 4086373) alterando-se a disposição das informações de forma a ser entendido como uma continuidade ao aprovado anteriormente. De igual maneira, acostamos o **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2019 vs 1.2** (doc. 4086392) com o alinhamento necessário ao presente Plano de Contratações.

#### Quadro do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019

PCSTIC 2019	ve	<b>STIC 2019</b> r <b>são 1.1</b> ido 11/2018)	PCSTIC 2019 versão 1.2 (proposta atual)				
1. DESPESAS DE CAPITAL	R\$	45.335.447,50	R\$	43.335.447,50			
2. DESPESAS CORRENTES	R\$	390.709,24	R\$	390.709,24			
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	R\$	44.888.400,92	R\$	41.480.281,84			
4. CONTRATOS VIGENTES	R\$	11.928.208,21	R\$	11.928.208,21			
	R\$	102.542.765,87	R\$	97.134.646,79			

Cabe informar que após a revisão pelo DTIC o novo Valor Global Previsto do PCSTIC 2019 versão 1.2 passou para R\$ 97.134.646,79 (noventa e sete milhões, cento e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Segue abaixo o detalhamento das ocorrências desta revisão do PCSTIC 2019 vs. 1.2:

- >> 06 ITENS CANCELADOS, resultando diminuição de R\$ 13.000.000,00, conforme segue:
- → Justificativa: Transferidos para o próximo PCSTIC 2020
- \*\* 1.2.2. Solução de Rede Wireless (expansão de access points), valor previsto R\$ 1.000.000.00.
- $^{**}$  1.2.4. Aquisição de ativos de rede switches e acessórios, valor previsto R\$ 3.000.000,00
- $\star\star$  3.2.5. Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing), SEI 0011007-49.2019.8.16.6000, valor previsto R\$ 5.000.000,00
- → Justificativa: alterado o objeto da contratação
- \*\* 1.2.3. Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP, SEI 0014104-57.2019.8.16.6000, valor previsto R\$ 1.000.000,00.

- → Justificativa: cancelado até a próxima revisão
- \*\* 3.1.1. Consultoria de ambiente MICROSOFT (Sharepoint e EPM), valor previsto R\$ 1.000.000,00
- → Justificativa: Transferido para DGST
- \*\* 3.2.13. Contratação de Solução para microfilmagem de Acervo Documental Administrativo do TJPR, SEI 0078705-09.2018.8.16.6000, valor previsto R\$ 2.000.000,00
- >> 07 ITENS ALTERADOS, resultando acréscimo no valor previsto em R\$ 3.390.953,42, conforme segue:
- \*\* 1.2.1. Aquisição de 3.000 microcomputadores (garantia 60 meses), SEI 0011365-14.2019.8.16.6000, valor previsto alterado de R\$ 14.000.000,00 para R\$ 15.000.000,00.
- \*\* 1.2.6. Aquisição de Equipamento de armazenamento de Backup em disco e Library (atender expansão e nova sala segura), SEI 0062631-74.2018.8.16.6000, valor previsto alterado de R\$ 4.000.000,00 para R\$ 6.000.000,00.
- \*\* 3.1.2. Aquisição de Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC. Envolve consultoria, implantação, treinamentos e monitoria, SEI 0032717-62.2018.8.16.6000, valor previsto alterado de 4.000.000,00 para R\$ 6.096.880,92.
- \*\* 3.1.3. Aquisição de 07 Licenças SW ADOBE Creative Cloud (Photoshop e outros) para Assessoria Imprensa e ESEJE, SEI 0013398-11.2018.8.16.6000, valor previsto alterado de R\$ 70.927,50 para R\$ 120.000,00.
- \*\* 3.1.11. Previsão de pagto ref. ao Contrato/Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF/CNPJ da Receita Federal, SEI 0059416-90.2018.8.16.6000, valor previsto alterado de R\$ 805.000,00 para R\$ 1.000.000,00.
- \*\* 3.2.11. Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol), SEI 0026644-40.2019.8.16.6000, valor previsto alterado de R\$ 150.000,00 para R\$ 200.000,00.
- \*\* 3.2.15. Aquisição da Solução de Inteligência Artificial nos processos judiciais, valor previsto alterado de R\$ 10.000.000,00 para R\$ 8.000.000,00.
- >> 03 ITENS NOVOS, resultando acréscimo no valor previsto em R\$ 4.200.000,00, conforme segue:
- \*\* 3.2.16. Contratação de Solução TI para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS (contrato de 48 meses), valor previsto de R\$ 200.000,00.
- \*\* 3.2.17. Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP, SEI 0014104-57.2019.8.16.6000, valor previsto de R\$ 1.000.000,00.
- \*\* 3.2.18. Solução de Segurança de Rede, valor previsto de R\$ 3.000.000,00.

Com tais considerações, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria o supramencionado Plano de Contratações de STIC (PCSTIC) e Plano Diretor de TIC (PDTIC) ambos devidamente revisados, o qual foram aprovados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGESTIC) em 27/05/2019 (ata disponível no doc. 4066356) e também pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC) em 31/05/2019 (ata disponível no doc. 4084682)

Respeitosamente,

Pablo Tavares Assessoria Técnica do DTIC

Diante da informação supra da Assessoria Técnica, que acolho, encaminhe-se à Supervisão Geral de Informática e Comunicação para análise e futura apresentação ao Excelentíssimo Desembargador Presidente.

#### **NELSON JOAQUIM SANTOS** Diretor do DTIC



Documento assinado eletronicamente por NELSON JOAQUIM SANTOS, **Diretor de Departamento**, em 07/06/2019, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por PABLO TAVARES, Analista **de Sistemas**, em 07/06/2019, às 13:26, conforme art.  $1^{\circ}$ , III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO MOLETTA ALVES, Supervisor de Assessoria Técnica de Departamento, em 07/06/2019, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 4086326 e o código CRC F83115C6.

0082732-35.2018.8.16.6000

4086326v8



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR www.tjpr.jus.br

#### **DESPACHO Nº 4119689 - P-SGIC**

SEI!TIPR № 0082732-35.2018.8.16.6000 SEI!DOC Nº 4119689

> Diante da adequação do presente procedimento de revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação -PCSTIC 2019 versão 1.2, bem como todo alinhamento necessário ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2019 versão 1.2, encaminho o feito à aprovação presidencial.

#### DES. MARCELO GOBBO DALLA DEA

Supervisor Geral de Informática e Comunicação

I. Trata o presente expediente da revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC para o exercício financeiro de 2019, que apresenta as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Consoante relatado no despacho nº 4093722 do Supervisor Geral de Informática e Comunicação, Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, a proposta de revisão do PCSTIC de 2019 e o respectivo alinhamento ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC de 2019 foram revisados e aprovados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGESTIC) em 27/05/2019 (Ata nº 4066356) e pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC) em 31/05/2019 (Ata nº 4084682).

O feito passou pelo crivo do Núcleo de Controle Interno, assim como do Departamento de Planejamento e do Departamento Econômico e Financeiro que efetivaram a avaliação do impacto financeiro em relação aos Planos apresentados (docs. 4111048 e 4116860).

**II.** Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente o doc. nº 4086373 - Plano de Contratações STIC 2019 versão 1.2, o doc. nº

4086392 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação -PDTIC 2019 versão 1.2 e o despacho do Supervisor Geral de Informática e Comunicação nº 4093722, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ **APROVO** a revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2019, no valor global previsto de R\$ 97.134.646,79 (noventa e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV - Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reeguipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Núcleo de Controle Interno.

Curitiba/Pr, data conforme assinatura digital.

### ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA

Desembargador Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Paraná



Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gobbo Dalla Dea, Supervisor Geral de Informática e Comunicação, em 14/06/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Adalberto Jorge Xisto Pereira, Presidente do Tribunal de Justica, em 18/06/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador **4119689** e o código CRC C967E04D.

0082732-35.2018.8.16.6000

4119689v2

### Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

#### Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

#### SEI Nº 0082732-35.2018.8.16.6000

Diante da adequação do presente procedimento de revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC 2019 versão 1.2, bem como todo alinhamento necessário ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2019 versão 1.2, encaminho o feito à aprovação presidencial.

#### DES. MARCELO GOBBO DALLA DEA

Supervisor Geral de Informática e Comunicação

I. Trata o presente expediente da revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC para o exercício financeiro de 2019, que apresenta as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Consoante relatado no despacho nº 4093722 do Supervisor Geral de Informática e Comunicação, Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, a proposta de revisão do PCSTIC de 2019 e o respectivo alinhamento ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC de 2019 foram revisados e aprovados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGESTIC) em 27/05/2019 (Ata nº 4066356) e pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC) em 31/05/2019 (Ata nº 4084682).

O feito passou pelo crivo do Núcleo de Controle Interno, assim como do Departamento de Planejamento e do Departamento Econômico e Financeiro que efetivaram a avaliação do impacto financeiro em relação aos Planos apresentados (docs. 4111048 e 4116860).

II. Tendo em vista o contidó no presente expediente, notadamente o doc. nº 4086373 - Plano de Contratações STIC 2019 versão 1.2, o doc. nº 4086392 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2019 versão 1.2 e o despacho do Supervisor Geral de Informática e Comunicação nº 4093722, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ APROVO a revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2019, no valor global previsto de R\$ 97.134.646,79 (noventa e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV - Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Núcleo de Controle Interno.

Curitiba, 18 de junho de 2019.

#### ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
